

付款申请

新疆通力建设集团股份有限公司：

2025 年第一项目经理部井场与附属简易路工程（第一批）项目，
已收工程款 847377.86 元，（大写金额：捌拾肆万柒仟叁佰柒拾柒元捌角陆分），承包人垫付资金 31308.58 元（大写金额：叁万壹仟叁佰零捌元伍角捌分），扣除各项费用 93216.75 元（含安全质保金）
（大写金额：玖万叁仟贰佰壹拾陆元柒角伍分），累计支付工程款 459069.69 元（大写金额：肆拾伍万玖仟零陆拾玖元陆角玖分），可用资金余额：326400.00 元，（大写金额：叁拾贰万陆仟肆佰元）。
现申请支付如下：

1、白碱滩区顺联运输服务部土石方运输费：326400.00 元；

合计：326400.00 元

望领导批准！

申请人：廖怀龙

2026 年 01 月 20 日

土石方运输合同

合同编号：TLJS-20251224-003

甲方（托运方）：新疆通力建设集团股份有限公司

乙方（承运方）：白碱滩区顺联运输服务部

因甲方 2025 年第一项目经理部井场与附属简易路工程（第一批）项目 的 土石方施工运输 需要，现需雇用乙方运输车辆。根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确甲、乙双方的权利与义务，经双方协商一致，特订立本合同。

一、运输车辆概况

车辆名称：重型自卸货车

型号：欧曼、陕汽、红岩牌

数量：4 辆

平厢体积：30 方

二、作业地点

白碱滩区

三、运输车辆进场时间

乙方运输车辆于 2025 年 03 月 27 日 到达作业地点，如遇到特殊情况，甲方及时通知乙方，双方共同协商确定进场时间。

四、运输作业

1、甲方负责项目场内施工便道的正常维修、维护工作，确保施工便道畅通。运输过程中需要通行项目场外的道路，由乙方负责协调，确保运输车辆的通行。

2、乙方负责装货，装货费用由乙方承担。

3、乙方负责货物运输，卸货由乙方负责，费用由乙方承担。

4、甲方要求乙方将货物完好的运输到指定地点，乙方在运输过程中采取各种有效措施保护好承运货物，确保货物无洒落、丢失。

5、如乙方未将货物卸到甲方的指定地点，乙方需无偿按甲方要求处理，由此产生的经济损失由乙方承担。

6、运输过程中因自然条件、防护措施及车辆故障等原因，造成货物数量损失、质量降级或无法按预期继续使用，由此产生的经济损失由乙方承担。

7、在运输过程中如乙方将承运货物转移给第三方，无论何种原因由乙方负责全额追回，由此产生的经济损失由乙方承担，乙方还需承担此批承运货物价值 5-10 倍



理。

向交警、
已包含在

场地内
土质情
况的相

运输车

2、乙方必须遵守安全生产方面的法律、法规及甲方各项安全管理制度，严格按照安全操作规程作业，防止发生安全事故。

3、乙方驾驶员在作业过程中，对不安全因素有权提出，并可根据规定拒绝甲方现场工作人员的违章指挥作业。

4、由于乙方原因引起的伤亡、火灾、车辆、物损、治安等各类事故，造成乙方自身（包括人员和车辆）、甲方或第三方人员伤亡和财产损失的，包括相关全部法律后果均由乙方承担事故责任和经济赔偿，甲方不承担任何责任和经济赔偿。

为了强化乙方安全责任的管理与履行，乙方签订本合同时，须同时签订“安全生产目标管理责任书”、“施工现场安全管理目标承诺书”。

5、因乙方造成的各类安全事故，甲方可协助乙方做好抢救工作，但所需费用由乙方承担。

六、运输结算单价及金额

1、土石方：不论运距远近结算运输单价：50.00元/方。双方约定运输距离/公里，土石方计划运输数量 6528 立方，金额合计 ¥326400.00 元。

2、基层混合料：不论运距远近结算运输单价：/元/方。双方约定运输距离/公里，基层混合料计划运输数量/立方，金额合计/元。

3、沥青混凝土：不论运距远近结算运输单价：/元/方。双方约定运输距离/公里，沥青混凝土计划运输数量/立方，金额合计/元。

4、水泥混凝土：不论运距远近结算运输单价：/元/方。双方约定运输距离/公里，水泥混凝土计划运输数量/立方，金额合计/元。

5、以上所述运输单价均为包干价，已包含税费、乙方管理费、临时设施费、及运输车辆调迁费等乙方为运输货物而发生的一切费用。本合同金额为 ¥326400.00 元（大写：叁拾贰万陆仟肆佰元整），其中：不含税金额为323168.32元，增值税金额为3231.68元。具体运量以现场实际为准，如现场实际运量未超出本合同金额，则以单价*实际运量进行结算。如现场实际运量超出了本合同金额，则双方另行签订补充协议进行补充。

七、运费结算

1、乙方装货后甲方现场人员验收数量并签发运发料单，货物到达后甲方现场人员验收数量并在运发料单签认收货数量。如乙方对甲方签认的单据有异议，必须当时提出，否则视为乙方接受且以后乙方不得以任何理由对此单据提出异议。

甲方（盖章）：新疆通力建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91650000761147533F

详细地址：新疆库尔勒市人民东路通力大厦

开户行：中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行

账号：65001705200052502826

甲方项目现场负责人或经其授权的代理人签字：

联系方式：

邮箱号：

乙方（盖章/签字）：白碱滩区顺联运输服务部

统一社会信用代码/身份证号：92650204MACUL70XXR

详细地址：新疆克拉玛依市白碱滩区中兴路街道远征花园 43 栋 37 号

开户行：中国银行股份有限公司克拉玛依市白碱滩支行

账户：107699017226

乙方法人代表/乙方（常秋兰）面签或私章：

联系方式（含单位）：18999311060

邮箱号：/

乙方经办人（/）面签：

联系方式：/



签订时间：2025 年 03 月 27 日

收 据

NO. 8471167

2026年 1 月20 日

今收到 新疆通力建设集团股份有限公司

交来 土石方运费 326400元

金 额(大写) 佰叁拾贰万陆仟肆佰零拾零元零角零分 ￥ 326400.00

附 注:

- ☐ 微信
- ☐ 现金
- ☐ 转账
- ☐ 支付宝
- ☐ 支票
- ☐ 其他

发据单位(盖章)

会计

出纳

经手人

李秋兰

第二联 客户联

SIMAA西玛 西玛优尚60开二联收据(20组) 8025

工程款结清证明

新疆通力建设集团股份有限公司：

兹有我白碱滩区顺联运输服务部与贵公司于2025年3月签订的土石方运输合同，合同金额：326400.00元。自合同签订之日至今已完成合同金额：326400.00元，并已结算，已向贵公司提供相关发票：326400.00元。贵公司已向我公司（单位）累计支付0元整。（人民币大写：零元整）

2026年1月20日，贵公司向我公司（单位）支付最后一笔款项：326400.00元整（人民币大写：叁拾贰万陆仟肆佰元整）后，贵公司应付我公司款项全部付清。

特此证明：2026年1月20日，我公司（单位）与贵公司就上述合同范围内的所有经济事项已全部结清，不存在未结算和未支付的经济事项，贵我双方的债权债务已全部结清。

自本证明出具起，所有有关该合同的未结算的经济事项包括但不限于经济签证、工程量单、出货单、收料单、欠条等均作废，我公司不再向贵公司主张任何权利。

本证明盖章有效，与合同同具法律效力。

证明单位（盖章）：

日期：2026年1月20日




运输渣土结算单

项目名称：2025年第一项目部井区（第一批）

金额单位：元

序号	车号	计量单位	数量	金额	驾驶员	
1	新G60777	立方	1650	82500.00	胡继银	
2	新G12488	立方	1630	81500.00	秦富廷	
3	新G61306	立方	1628	81400.00	谭宏明	
4	渝DE0096	立方	1620	81000.00	孙无敌	
合计			6528.00	326400.00		
项目负责人 签字：察怀龙 2025年12月25日		承包人：白碱滩区顺联运输服务部 签字：常秋兰 2025年12月24日		起运地：玛湖500亩料场 到达地：第一项目部井区（第一批） 运输货物：戈壁料		

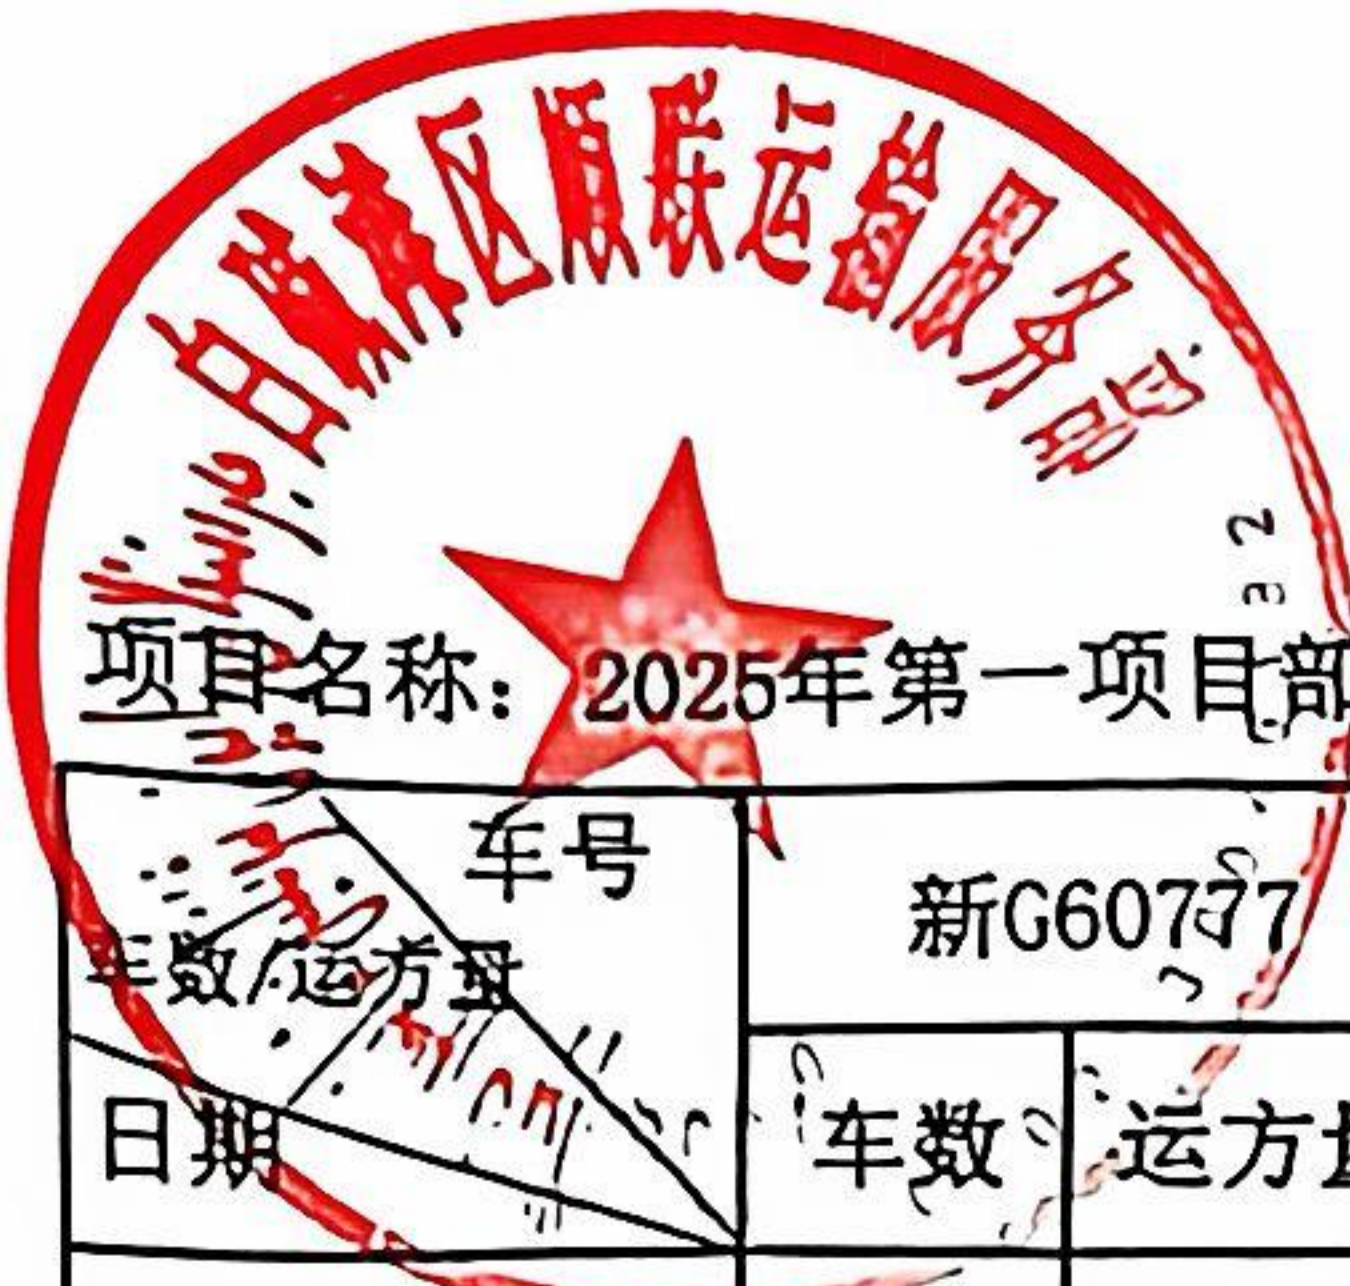

车辆运输土方数量统计表

项目名称：2025年第一项目部井区（第一批）

单位：立方

日期	新G60737		新G12488		新G61306		渝DE0096						合计		备注
	车数	运方量	车数	运方量	车数	运方量	车数	运方量					车数	运方量	
3.27	2	60	2	62	2	60	2	60					8	242	
3.28	2	60	1	31	1	30	2	60					6	181	
3.29	2	60	2	62	2	60	2	60					8	242	
3.30	2	60	2	62	2	60	1	30					7	212	
3.31	1	30	2	62	1	30	1	30					5	152	
4.01	1	30	1	31	1	30	1	30					4	121	
4.02		0		0		0		0					0	0	
4.03	2	60	2	60	2	62	2	60					8	242	
4.04	2	60	2	60	2	62	2	60					8	242	
4.05	2	60	2	60	2	60	1	30					7	210	
4.06	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.07	2	60	1	30	2	62	2	60					7	212	
4.08	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.09	2	60	2	60	2	62	2	60					8	242	
4.10	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.11	1	30	1	30	1	30	2	60					5	150	
4.12	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.13	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.14	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.15		0		0		0		0					0	0	
4.16		0		0		0		0					0	0	
4.17		0		0		0		0					0	0	
4.18	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.19	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.20	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.21	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.22	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.23	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.24		0		0		0		0					0	0	
4.25	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.26	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.27	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
4.28	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.29	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
4.30	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
5.05	2	60	2	60	2	60	2	60					8	240	
5.06	2	60	2	60	2	60	1	30					7	210	
5.07	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
5.08	1	30	1	30	1	30	2	60					5	150	
5.09	1	30	1	30	1	30	1	30					4	120	
	55	1650	54	1630	54	1628	54	1620	0	0	0	0	217	6528	

施工负责人：



土方运输车辆统计表

单位: 辆

项目名称：2025年第一批项目部非区（第一批）																																						
3月				4月																								5月				合 计						
27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30			
车号	2	2	2	1	1	/	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	/	/	/	/	2	2	2	2	1	1	/	2	2	2	1	1	1	1		
新G60777	2	1	2	2	2	1	/	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	/	/	/	/	2	2	2	2	1	1	/	2	2	2	1	1	1	1		
新G12488	2	1	2	2	1	1	/	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	/	/	/	/	2	2	2	2	1	1	/	2	2	2	1	1	1	1		
新G61306	2	1	2	2	1	1	/	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	/	/	/	/	2	2	2	2	1	1	/	2	2	2	1	1	1	1		
渝DE0096	2	2	2	1	1	1	/	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	/	/	/	/	2	2	2	2	1	1	/	2	2	1	1	2	1	1		
	8	6	8	7	5	4	0	8	8	7	8	7	8	8	4	5	4	4	4	0	0	0	0	8	8	8	4	4	4	0	8	8	7	4	5	4	0	217

施工负责人:
